

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



# ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

*автодорог Яжелбицкого сельского поселения*

*Валдайского района Новгородской области*

*том 22 (томов 30) д. Княжово*

*Заказчик: Администрация Яжелбицкого  
сельского поселения Валдайского района  
Новгородской области*

*Разработчик: Индивидуальный предприниматель  
Панов Иван Борисович*

**СОГЛАСОВАНО**

*Утверждено: Главой поселения*

\_\_\_\_\_ И. Б. Панов

*Инженер проекта:*

\_\_\_\_\_ С. Р. Романов

\_\_\_\_\_ А. И. Иванов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>СОДЕРЖАНИЕ</i> .....	330
<i>Условные обозначения</i> .....	331
<i>д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 1</i> .....	332
<i>д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 2</i> .....	335
<i>д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 3</i> .....	338
<i>Ведомости</i> .....	341

# Условные обозначения


	<p>2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 - Местоположение знака</p>	<p>П.1 Пешеходный тип светофора П.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>2.4 - Проектируемый дорожный знак</p>	<p>T.5 Транспортный тип светофора T.5</p>	<p>Покрытие проезжей части: грунт</p>
 	<p>2.4 - Знак, обслуживаемый сторонней организацией 2.4 - Демонтируемый дорожный знак</p>	<p>T.1 Транспортный тип светофора T.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: ПГС</p>
	<p>Автобусная остановка</p>	<p>T.7 Транспортный тип светофора T.7</p>	<p>Покрытие проезжей части: асфальтобетон</p>
	<p>Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 - 2011</p>	<p>Искусственная дорожная неровность</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Проектируемое дорожное ограждение</p>	<p>Существующее освещение</p>	<p>Покрытие проезжей части: ЩПС</p>
	<p>Существующее дорожное ограждение</p>	<p>Проектируемое свечение</p>	
	<p>Проектируемое пешеходное ограждение</p>	<p>Мостовое сооружение</p>	
	<p>Существующее пешеходное ограждение</p>	<p>Водопропускная труба</p>	
	<p>Существующие сигнальные столбики</p>	<p>Железнодорожный переезд</p>	
	<p>Проектируемые сигнальные столбики</p>		
	<p>Существующий тротуар</p>		
	<p>Проектируемый тротуар</p>		
	<p>Проектируемый бордюр</p>		
	<p>Существующий бордюр</p>		
	<p>ЛЭП и другие коммуникации</p>		

***д. Княжово (от д. №1 до д. №27)  
участок 1***

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (шпс)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

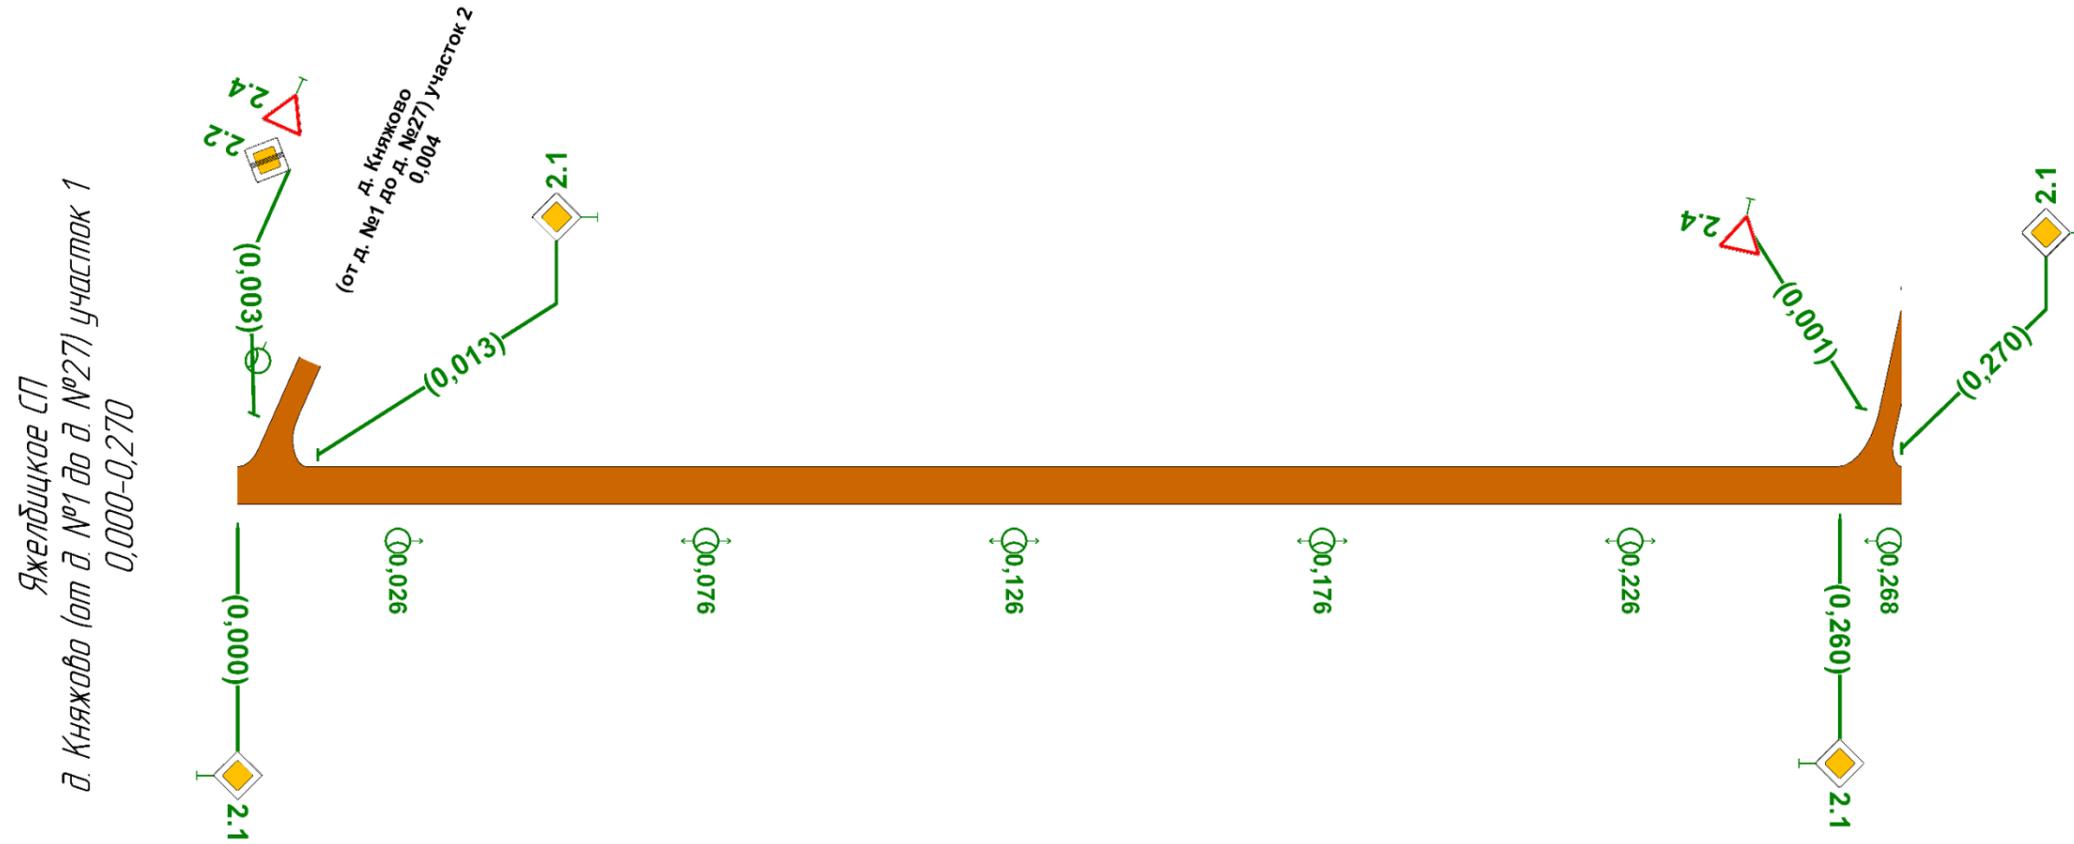

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (обочина) полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (шпс)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Княжово (от д. №1 до д. №27)  
участок 2*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева				
Ширина слева, м	Обочина			0,00
	Краевая полоса			0,00
	Проезжая часть			150 (шпс)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	-		
	На разделительной	-		
Дорожная разметка слева		-		
Элементы в плане		0,012	R=45, L=35	0,047
Продольный профиль			R=2077, L=71	0,071
Видимость в обратном направлении			R=1094, L=47	0,118
			R=16, L=22	0,136
			R=697, L=22	0,140

Яжелдцкое СП  
д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 2  
0,000-0,140

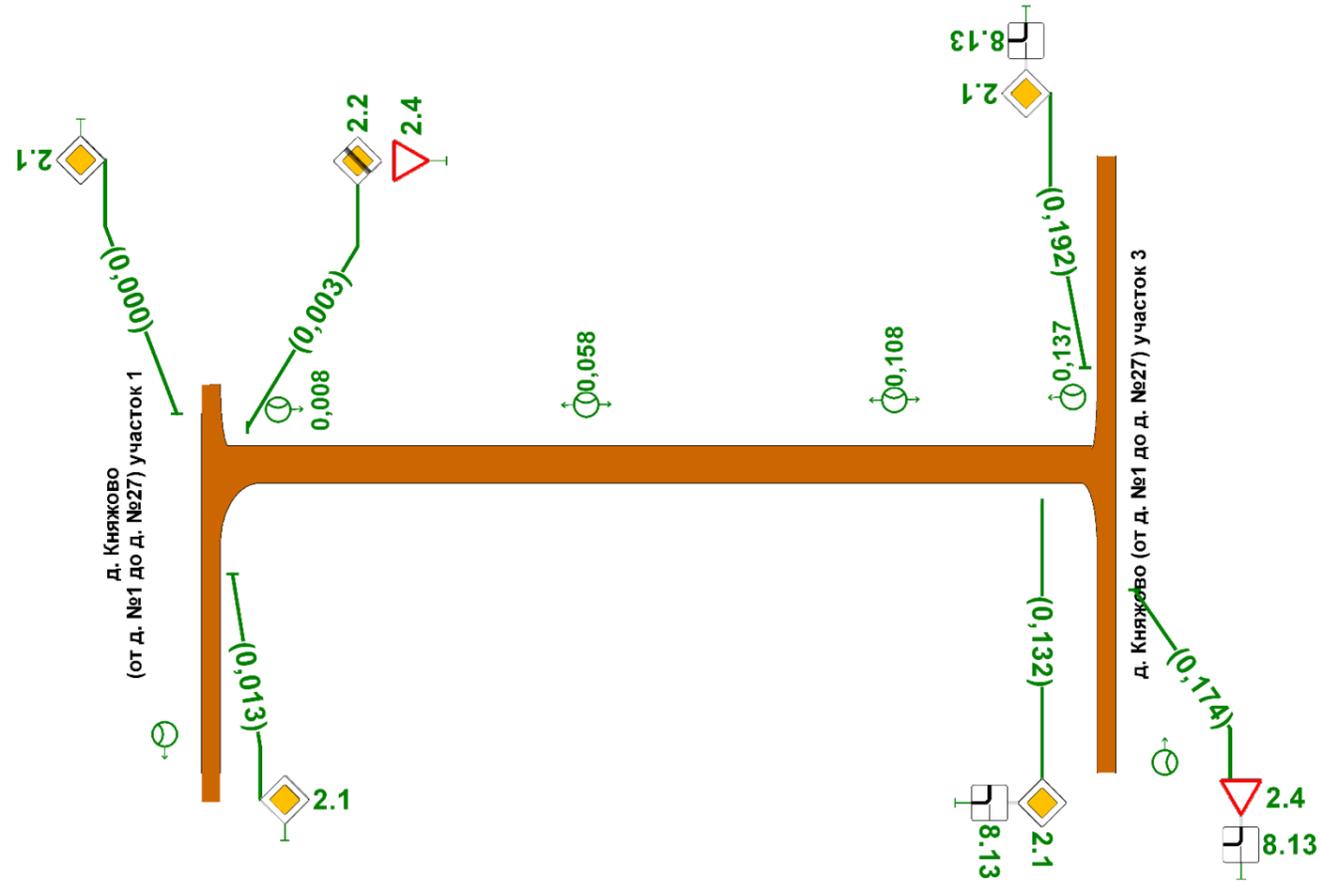

Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа		-		
Ширина справа, м	Разделительная (обочина) полоса			0,00
	Проезжая часть			150 (шпс)
	Краевая полоса			0,00
	Обочина			0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	-		
	На обочине	-		
Тротуары справа		-		


*д. Княжово (от д. №1 до д. №27)  
участок 3*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева				
Ширина слева, м	Обочина		0,00	0,00
	Краевая полоса		0,00	0,00
	Проезжая часть		150 (шпс)	150 (шпс)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	-----		
	На разделительной	-----		
Дорожная разметка слева		-----		
Элементы в плане		0,017	R=153, L=51	0,068
Продольный профиль			R=40, L=15	0,088
Видимость в обратном направлении			R=19, L=29	0,117
			R=45, L=65	0,182
			R=17602, L=270	

Яжелдцкое СП  
д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 3  
0,000-0,270

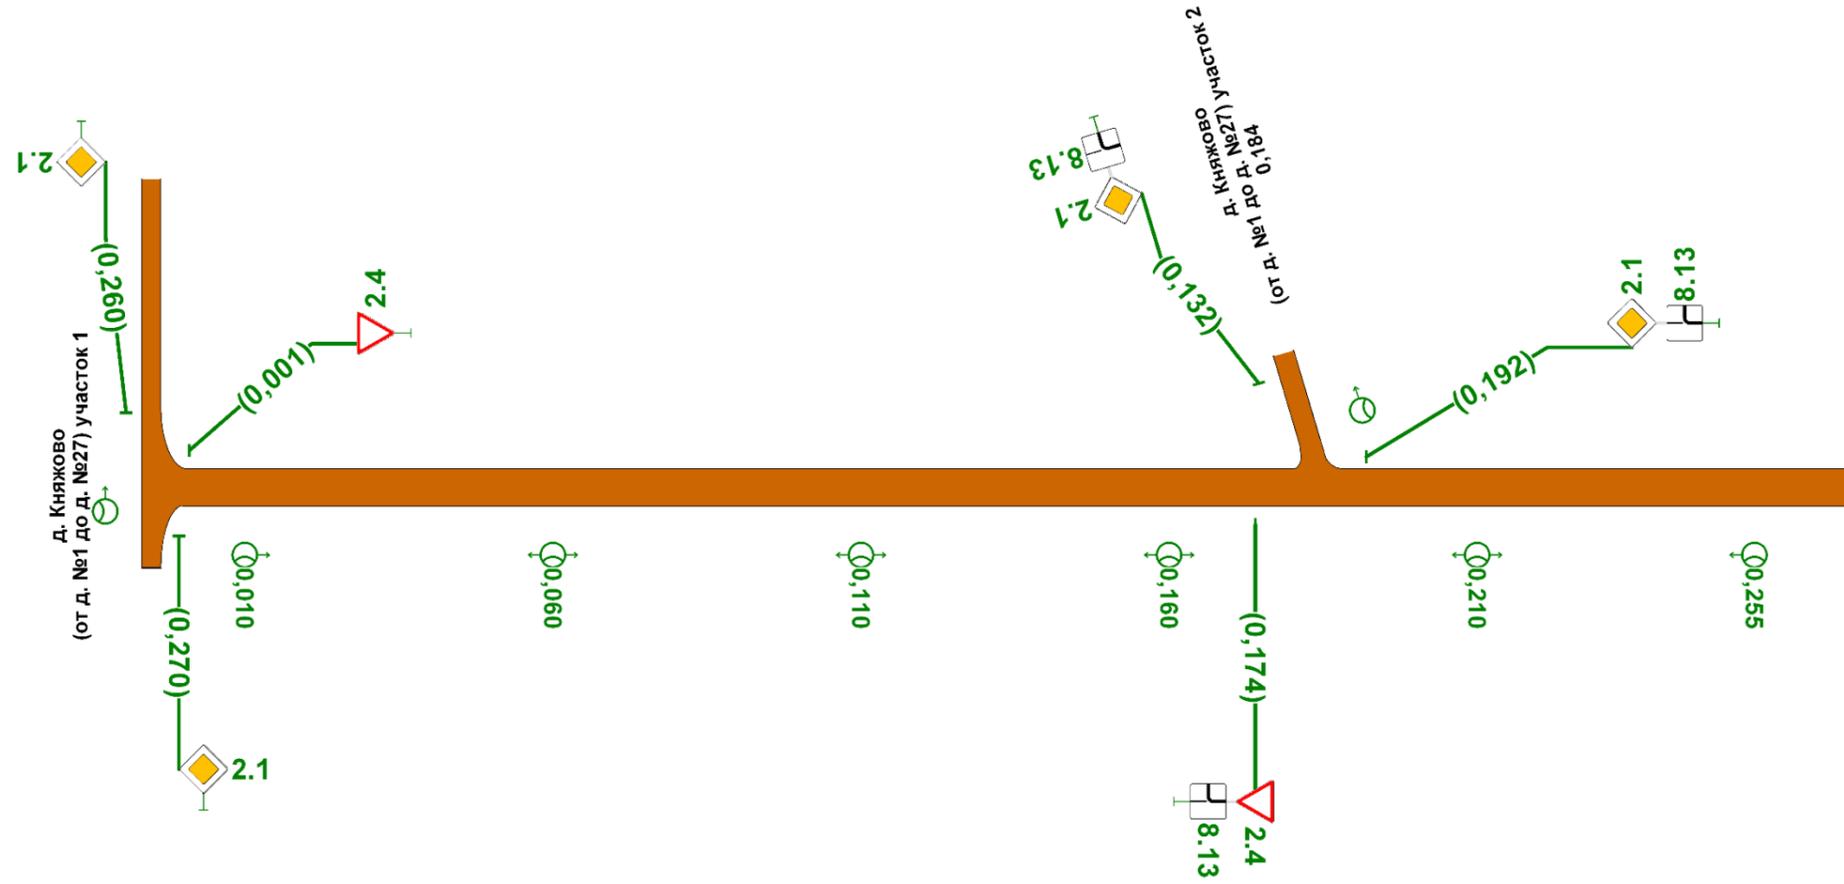

Видимость в прямом направлении				
Дорожная разметка справа		-----		
Ширина справа, м	Разделительная (обочина) полоса		0,00	0,00
	Проезжая часть		150 (шпс)	150 (шпс)
	Краевая полоса		0,00	0,00
	Обочина		0,00	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	-----		
	На обочине	-----		
Тротуары справа		-----		

## Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков  
д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
<b>Знаки приоритета</b>							
2.1	Главная дорога	II		0,000	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,013	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,260	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,270	Требуется	1	На разделительной
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость размещения дорожных знаков  
д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
<b>Знаки приоритета</b>							
2.2	Конец главной дороги	II		0,003	Требуется	1	На разделительной
2.4	Уступите дорогу	II		0,003	Требуется	1	На разделительной
2.1	Главная дорога	II		0,132	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>							
8.13	Направление главной дороги	II		0,132	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					

ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	4

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок Э

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II		0,001	Требуется	1	На разделительной
2.4	Уступите дорогу	II		0,174	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,192	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II		0,174	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,192	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,000	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,013	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,260	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,270	На разделительной	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
<b>Итого</b>								Установлено		0	
								Требуется		4	
								Перенести		0	
								К демонтажу		0	
								Все		4	

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,003	На разделительной	2.2	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.4	II	А 900	0,35		Требуется			
2	0,132	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	В 700	0,49		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено		0	
								Требуется		4	
								Перенести		0	
								К демонтажу		0	
								Все		4	

Ведомость размещения дорожных знаков  
д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 3

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,001	На разделительной	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,174	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
3	0,192	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено	0		
								Требуется	5		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	5		

**Итого по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	6
2.2	II	B700	Требуется	1
2.4	II	A900	Требуется	3
8.13	II	B700	Требуется	3
<b>Итого</b>			Установлено	0
			Требуется	13
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	13

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
A900		0,35	Требуется	3	1,05
B700		0,49	Требуется	10	4,90
<b>Итого</b>			Установлено	0	0,00
			Требуется	13	5,95
			К демонтажу	0	0,00
			Все	13	5,95

## Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	9	27,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	9	27,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	9	27,00

## Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м <sup>3</sup>	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м <sup>3</sup>
Монолитный		0,234	Проектируемый	9	2,107
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	9	2,107
			К демонтажу	0	0,000
			Все	9	2,107

## Ведомость размещения искусственного освещения

д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,026	0,268		6/6	242	Требуется	Правая кромка

## Ведомость размещения искусственного освещения

д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,008	0,137		4/4	129	Требуется	Левая кромка

## Ведомость размещения искусственного освещения

д. Княжово (от д. №1 до д. №27) участок 3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,255		6/6	245	Требуется	Правая кромка

## Итого по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	16/16	616
