

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелдицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 23 (томов 30) д. Варницы

*Заказчик: Администрация Яжелдицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области*

*Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович*

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....347

Условные обозначения.....348

д. Варницы (от д. №5 до д. №45).....349


Ведомости.....354


Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				


*д. Варницы (от д. №5 до д.
№45)*

СХЕМА АВТОДОРОГИ

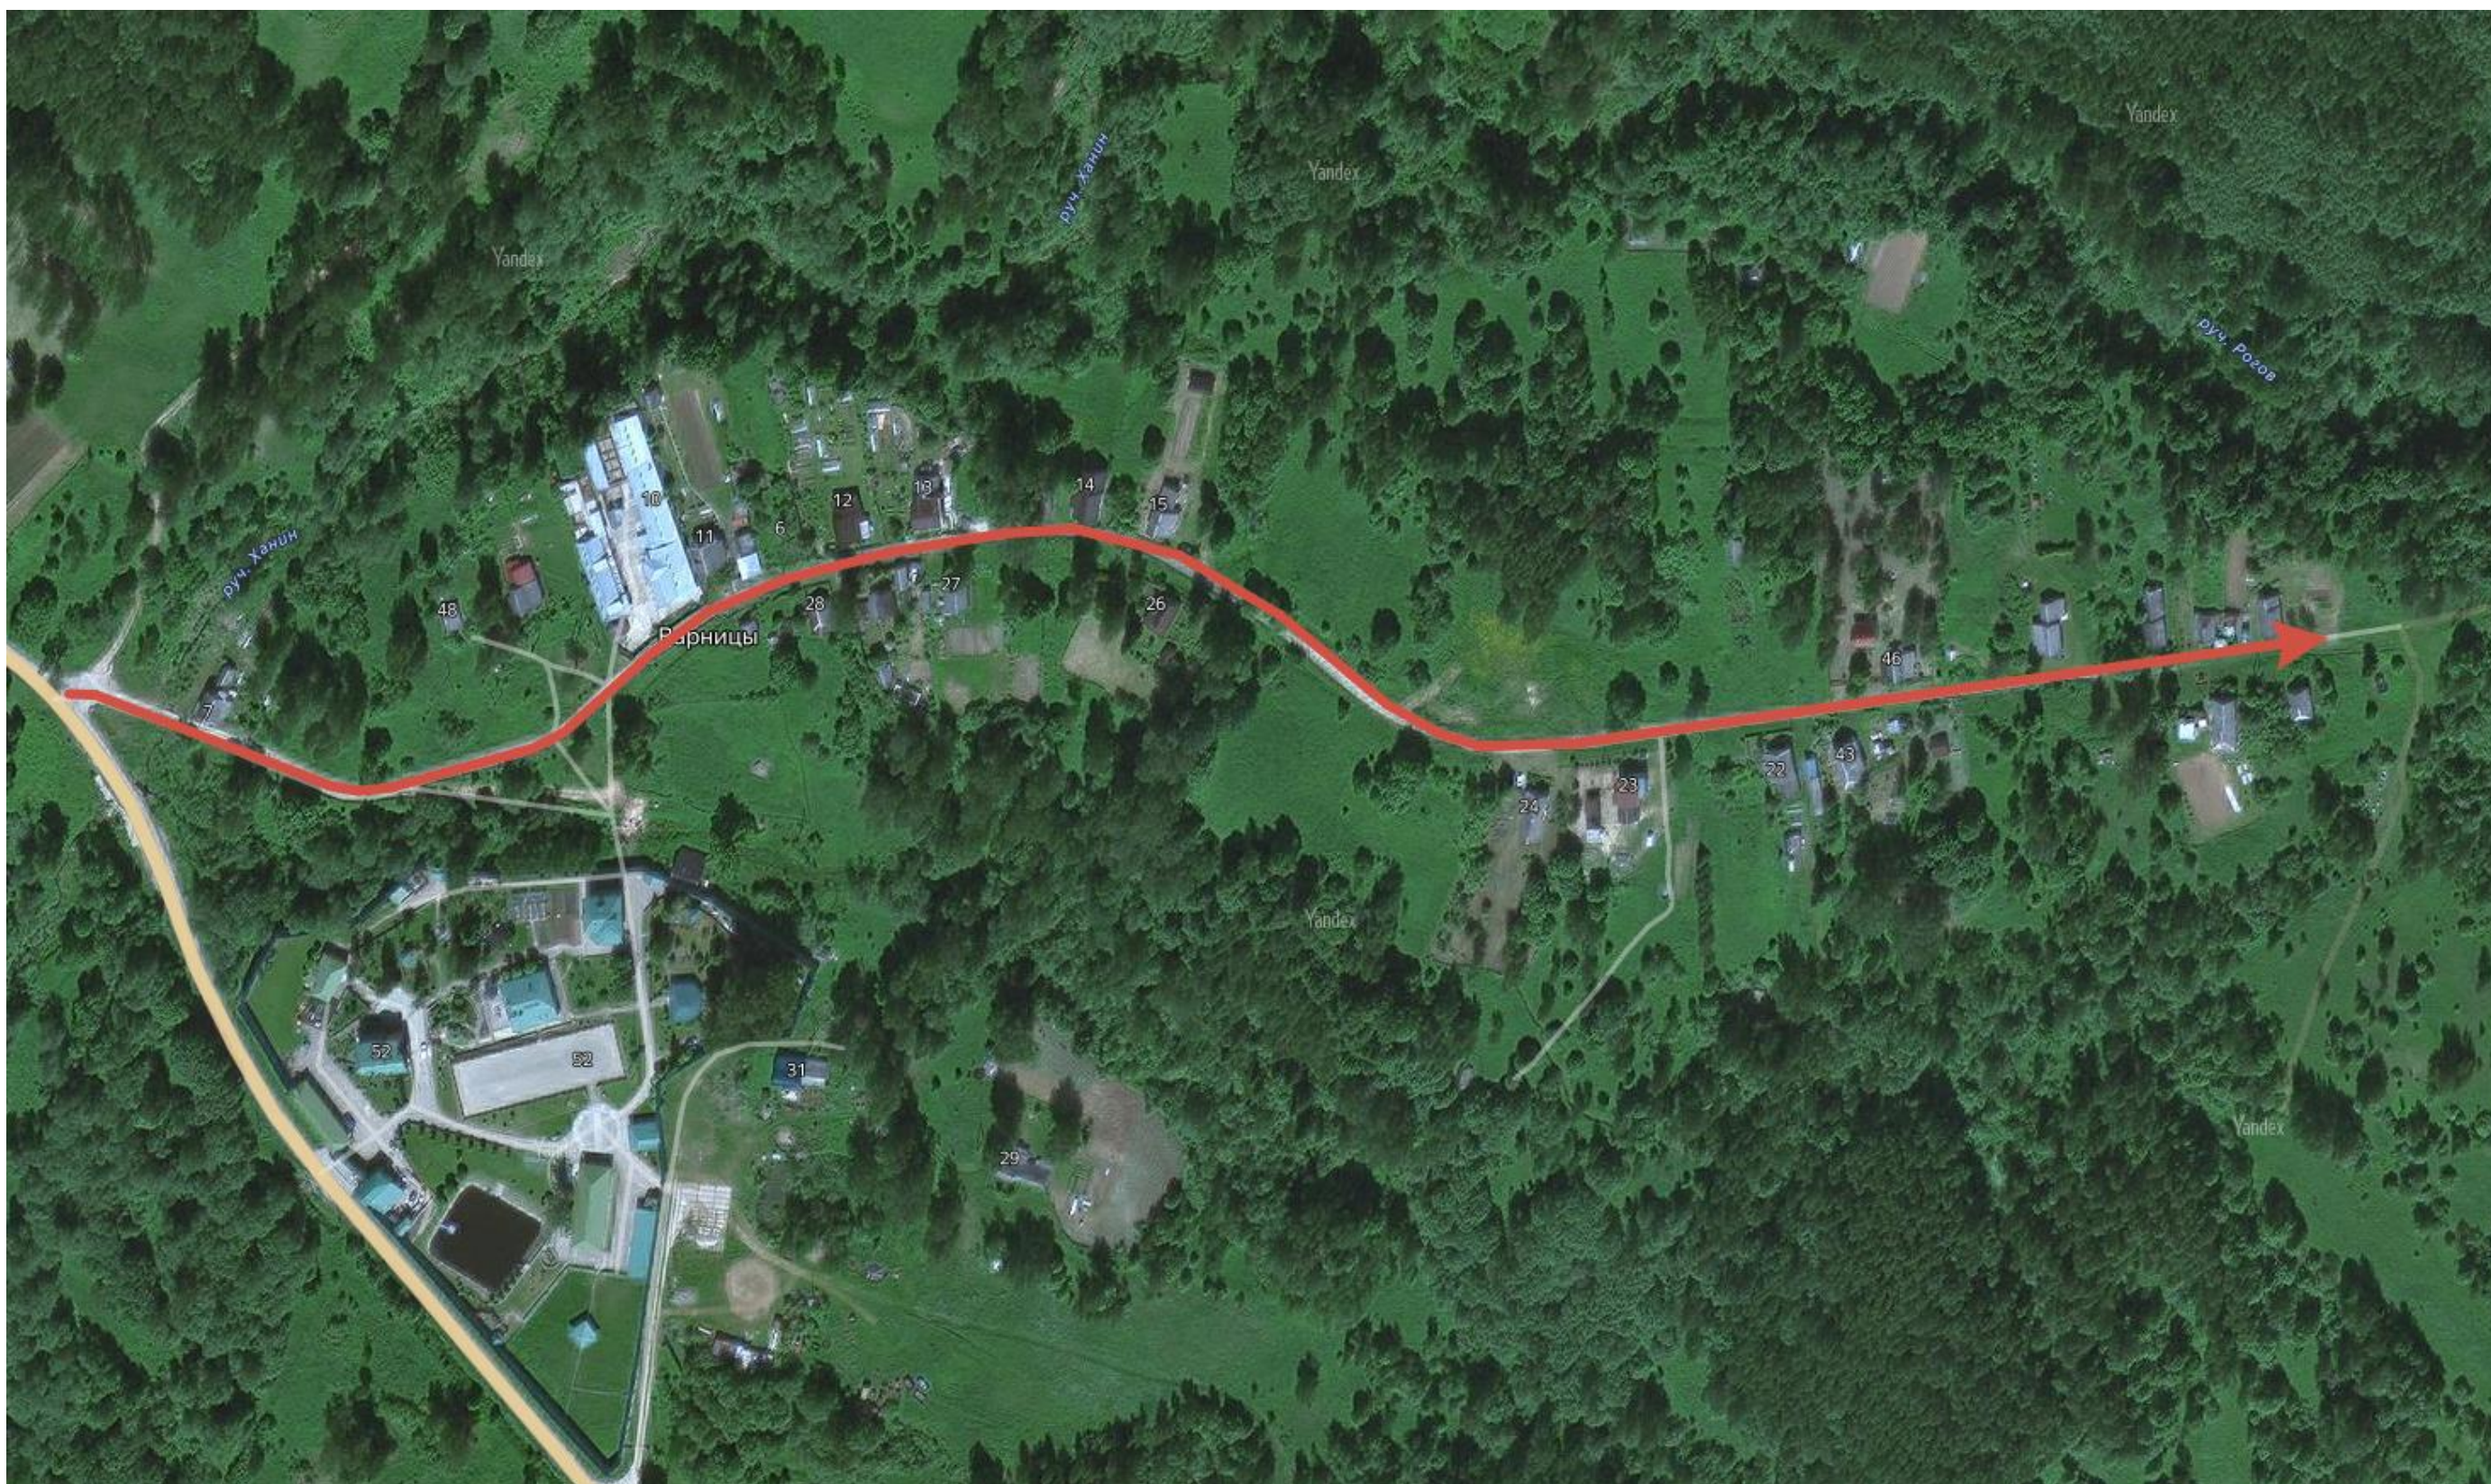

Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина	0,00	0,00
	Краевая полоса	0,00	0,00
	Проезжая часть	150 (шпс)	150 (шпс)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			


Яжелдцкое СП
д. Варницы (от д. №5 до д. №45)
0,290-0,630

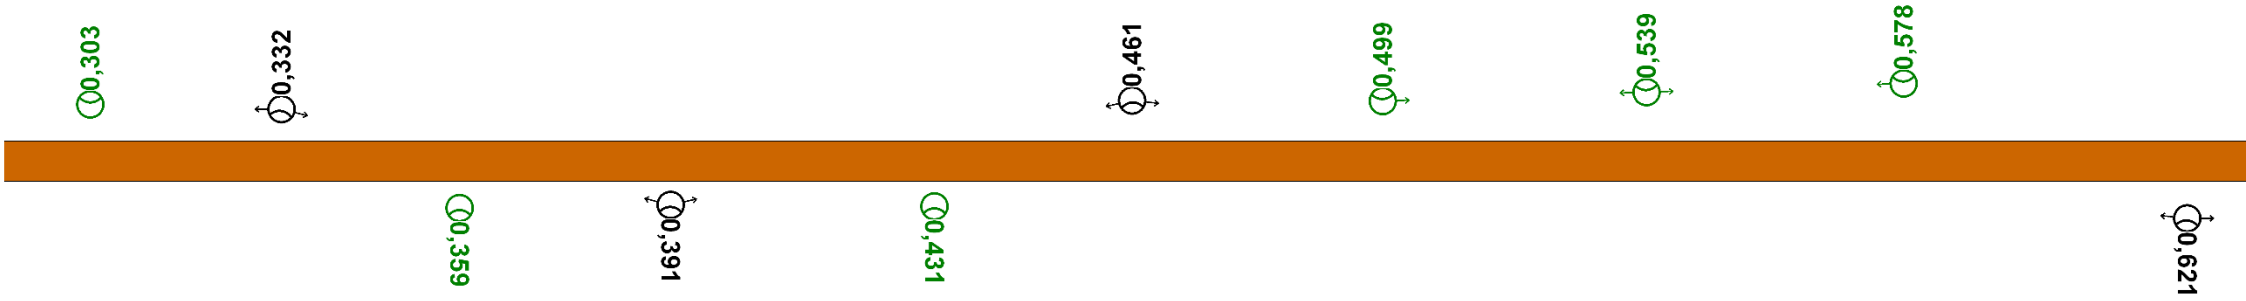

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00	0,00
	Проезжая часть	150 (шпс)	150 (шпс)
	Краевая полоса	0,00	0,00
	Обочина	0,00	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (шпс)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

006,0-009,0
Якълдлццкое СП
(57,4 N. d. од 5,6 N. d. ш) члпндра d



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (осевой) полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (шпс)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Варницы (от д. №5 до д. №45)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,008	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,020	Требуется	1	Яжелдицы – Дворец Справа
2.1	Главная дорога	II		0,050	Требуется	1	Яжелдицы – Дворец Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Варницы (от д. №5 до д. №45)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,008	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,020	Яжелдицы – Дворец Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,050	Яжелдицы – Дворец Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		3		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	2
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
B700		0,49	Требуется	2	0,98
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,33
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,33

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	3	9,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	3	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	9,00

Итоги по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	3	0,702
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	3	0,702
			К демонтажу	0	0,000
			Все	3	0,702

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Варницы (от д. №5 до д. №45)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,011	0,170		5/5	159	Требуется	Левая кромка
2	0,215	0,842		8/8	627	Установлено	Правая кромка
3	0,303	0,303		1/1	0	Требуется	Левая кромка
4	0,359	0,359		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,431	0,431		1/1	0	Требуется	Правая кромка
6	0,499	0,578		3/3	79	Требуется	Левая кромка
7	0,664	0,664		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,740	0,812		3/3	72	Требуется	Правая кромка
9	0,875	0,875		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	16/16	310
Установлено	8/8	627
